

つばさ南・つばさ北小学校

統合協議会だより


令和7年1月発行【第17号】 川島町教育委員会 学校統合推進室

☆つばさ小学校低学年棟建設工事の進捗状況をお知らせします（5回目）

今春4月に、つばさ小学校（つばさ南小とつばさ北小を統合した学校）と川島中学校による施設一体型・小中一貫教育校を開校するため、現在、中学校地内で、小学校低学年棟（小学校1～4年生を収容する校舎）の建設工事を行っています。

今回は、「内装・家具工事」の状況について、お知らせします。

◇低学年棟配置図（工事箇所）

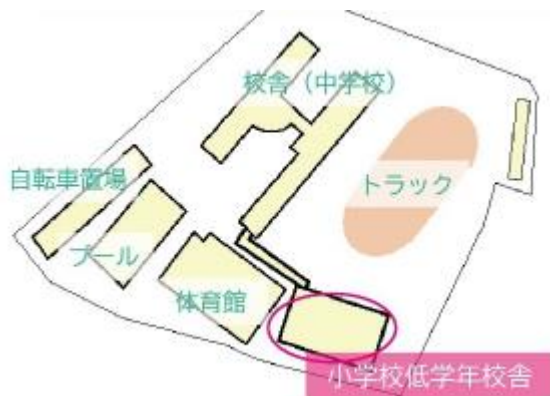

◇低学年棟完成イメージ図



◇工事全体の工程及びスケジュール

工事は、概ねつぎのような工程、スケジュールにより進みます。

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| ①「杭工事」 | 6～ 7月（完了） |
| ②「基礎工事」 | 7～ 8月（完了） |
| ③「鉄骨建方工事【建物骨組】」 | 8～ 9月（完了） |
| ④「外装工事【屋根・外壁・サッシ】」 | 10～11月（完了） |
| ⑤「内装・家具工事」 | 12～ 1月（完了） ⇐ ここまで完了しました。 |
| ⑥「完成」 | 来年1月末（予定） |

～ご質問やご意見がありましたら、下記事務局までお寄せください。～
つばさ南・つばさ北小学校統合協議会事務局 川島町教育委員会 教育総務課 学校統合推進室
TEL：049-299-1730 FAX：049-297-8410

☆5 回目「内装・家具工事」について

今回は、昨年 10 月初旬から 1 月初旬まで実施した「内装・家具工事」についてお知らせします。

この工事は、屋根、外壁、サッシ工事が終わった箇所から、順次、建物内部のコンクリート床、内壁、天井を仕上げて行き、最後に、家具や黒板などを取り付ける工事です。

工事作業の様子は、つぎのとおりです。

1. 「 コンクリート床工事 」

		この工事は、屋根、外壁工事が終わった後、建物内部に入って、床を作ってゆくものです。 左の写真は、床にコンクリートを打設する前の状態となりますが、すでに、この床下に、防湿シートと断熱材が敷かれており、さらにその上には溶接金網の敷き込みが終わっています。この上にコンクリートを打設します。 写真右は、コンクリートの打設が完了した様子です。 これで建物内部にしっかりした床が出来ました。
--	---	---

2. 「 内部壁、天井下地・建具工事 」

		この工事は、床にコンクリートの打設が終わった後、内部の間仕切（壁）と天井を作るものです。 左の写真は、内壁の下地を組んで、断熱材も入れ終わり、また、天井裏になる部分に、空調機や配管を取り付けている様子です。 右の写真は、教室の入口になる箇所に建具を付け、また、壁には石膏ボードを貼り、さらに天井裏には下地を組んで、断熱材を敷き込んだ状態です。 このように、この建物では、屋根と天井裏で二層の断熱しております。
---	--	---

3. 「 内装仕上げ工事 1 」

		左の写真は、床にフローリングを貼る前に、さらに床面を水平にするため、セルフレベリング施工している様子です。 セルフレベリングとは、水分の多いセメントペースト材を床に流し、水が水平になる性質を利用することで、セメントで床を水平する工法です。 右の写真は、セルフレベリングが硬化した後、廊下の腰壁に、杉板目板を貼った状態です。
---	--	--

4. 「 内装仕上げ工事 2 」

		左の写真は、組み立て終わった天井下地の下に、天井面として化粧石膏ボードを貼っている様子です。 右の写真は、天井の化粧石膏ボード、腰壁の杉板目板の貼り付けが終わった箇所から、順次、壁紙を貼り、内壁を仕上げていく様子です。
--	---	---

5. 「 内装仕上げ工事 3 」

 (図書室)	 (中庭・ウッドデッキ)	左の写真は、床にフローリングを貼り終えたところです。 右の写真は、中庭（屋外）です。ここにウッドデッキを組み立てました。 この校舎は、東棟・中央棟・西棟の3棟ありますが、棟の間に中庭を2箇所設けました。教室や廊下から出入りできるようになっています。
--	---	---

6. 「 家具・黒板取付工事 」



図書室



教室

左の写真は、床にフローリングを貼り終えた部屋から、順次、家具を設置したところです。この写真の部屋は図書室で、書架が設置されたことが分かります。

右の写真は、教室に黒板を取り付けた状態です。

この黒板は上下に 30cmほどスライドできるもので、先生が書きやすく、また席が後ろの子どもたちも見やすいよう考慮されています。

黒板の右にあるライトグリーンの部分は掲示板です。

もう少しで完成となります。
