

## 事業概要【(平成 26 年度実施) 中山小学校・伊草小学校校舎非構造部材耐震化工事】

工事場所	工事請負額	用途・面積・構造	主な工事内容
川島町立中山小学校 (川島町大字中山 1,333)	17,172,000 円	校舎 建築：S53.12 他 面積：4,623 m <sup>2</sup> (延) 構造：鉄筋コンクリート造	ガラス交換(普通→強化) 951.95 m <sup>2</sup> 飛散防止フィルム貼 143.16 m <sup>2</sup> C B壁改修 31.51 m <sup>2</sup> 棚、家具固定 126 箇所 ピアノ耐震化 1 箇所 エアコン転倒防止 8 箇所 タイル改修 5.85 m <sup>2</sup>
川島町立伊草小学校 (川島町大字伊草 238-1)	10,692,000 円	校舎 建築：H17.12 面積：4,218 m <sup>2</sup> (延) 構造：鉄筋コンクリート造	ガラス交換(普通→強化) 42.16 m <sup>2</sup> C B壁改修 40.87 m <sup>2</sup> 天井補強 698.60 m <sup>2</sup> 棚、家具固定 122 箇所 ピアノ耐震化 2 箇所 エアコン転倒防止 4 箇所 クラック改修 20.70m

※ これらの事業には、「学校施設環境改善交付金」(国の平成 25 年度東日本大震災特別復興会計当初予算分)が充てられている。

※ 交付金事業名：防災機能強化(非構造部材耐震化)

## 工事完成写真（主な工事内容）


○ガラス窓（場所：校舎廊下）



○ガラス交換等……普通ガラスを強化ガラスに交換、ビートをゴム製から樹脂製に交換



○コンクリートブロック壁（場所：校舎廊下の壁）…… コンクリートブロックを撤去し、軽量鉄骨+石膏ボードに改修（点線で囲った範囲）

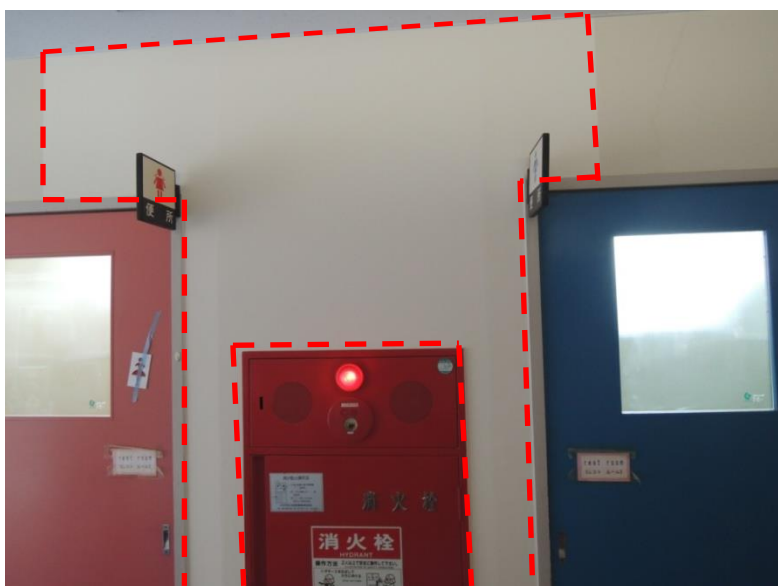


## 工事完成写真（主な工事内容）

○棚（場所：校舎内教室）



○棚の固定…… 棚の上部を、L字金具により壁に固定

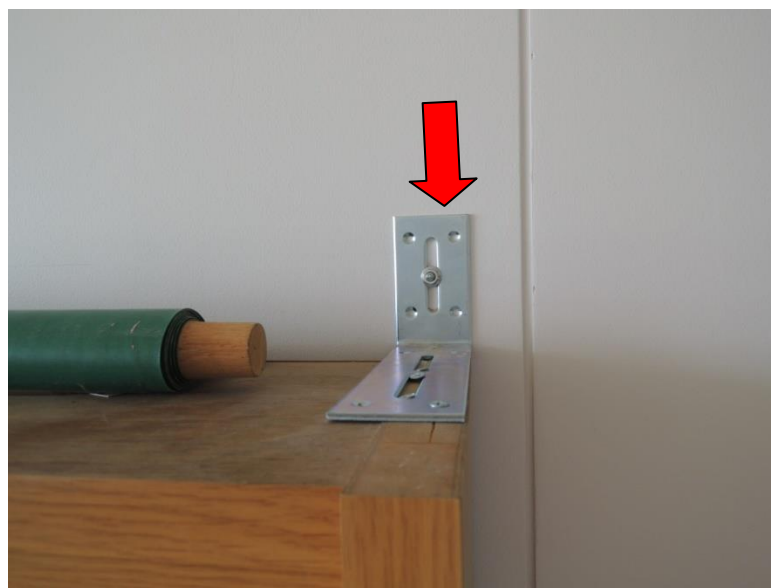

○エアコン室内機（場所：校舎内教室）



○室内機の固定…… ワイヤールにて壁に固定






# 工事完成写真（主な工事内容）

○吊り天井（場所：校舎内廊下）



○吊り天井の補強……斜めに支持材を入れて補強

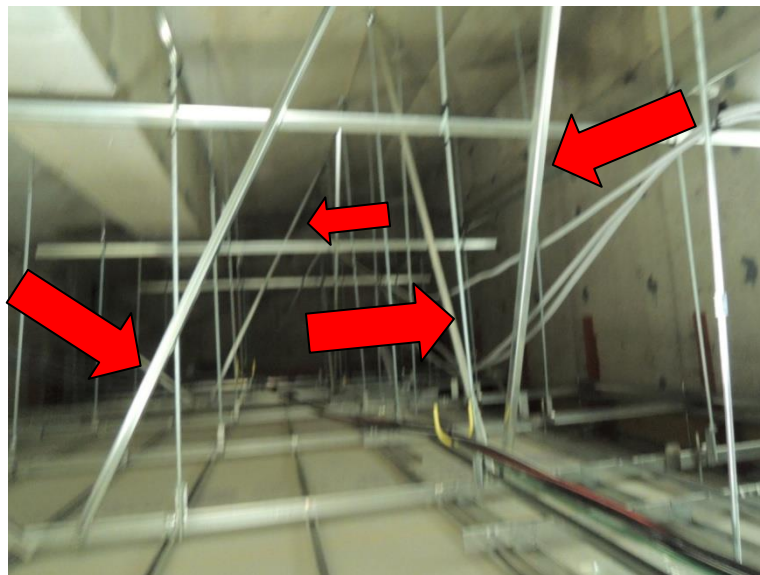

○ピアノ（場所：校舎内音楽室）

グランドピアノの耐震化①…… 補助脚設置、インシュレータ（皿）交換、斜め支持材により脚部補強



## 工事完成写真（主な工事内容）

○ピアノ（場所：校舎内音楽室）

アップライトピアノの耐震化…… 滑車の脱輪防止、敷板設置

