

事業概要【(平成 25 年度実施)川島町立小中学校体育館非構造部材耐震化工事】

工事場所	工事請負額	用途・面積・構造	主な工事内容
川島町立中山小学校 (川島町大字中山 1, 333)	4, 578, 000 円	体育館 建築 : S53. 12 面積 : 1, 019 m ² 構造 : 鉄筋コンクリート造	ガラス交換(普通→強化) 181. 3 m ² 飛散防止フィルム貼 83. 6 m ² 棚固定 6 箇所 ピアノ耐震化 1 箇所 屋根漏水修繕 1 式
川島町立三保谷小学校 (川島町大字白井沼 945)	9, 502, 500 円	体育館 建築 : S55. 3 面積 : 733 m ² 構造 : 鉄骨造	ガラス交換(普通→強化) 162. 4 m ² 飛散防止フィルム貼 15. 9 m ² 棚固定 5 箇所 ピアノ耐震化 1 箇所 照明交換(白熱灯→LED) 25 台
川島町立出丸小学校 (川島町大字上大屋敷 100)	3, 780, 000 円	体育館 建築 : S54. 2 面積 : 761 m ² 構造 : 鉄骨造	ガラス交換(普通→強化) 145. 8 m ² 飛散防止フィルム貼 21. 5 m ² 棚固定 2 箇所 ピアノ耐震化 1 箇所
川島町立八ツ保小学校 (川島町大字畑中 31)	9, 870, 000 円	体育館 建築 : S55. 12 面積 : 733 m ² 構造 : 鉄骨造	ガラス交換(普通→強化) 115. 9 m ² 飛散防止フィルム貼 70. 6 m ² ピアノ耐震化 1 箇所 照明交換(白熱灯→LED) 25 台
川島町立小見野小学校 (川島町大字谷中 99)	3, 097, 500 円	体育館 建築 : S57. 1 面積 : 740 m ² 構造 : 鉄骨造	ガラス交換(普通→強化) 144. 0 m ² 飛散防止フィルム貼 21. 2 m ² ピアノ耐震化 1 箇所
川島町立川島中学校 (川島町大字白井沼 230)	5, 250, 000 円	体育館、クラブハウス 建築 : S61. 2 面積 : 1, 487 m ² 構造 : 鉄骨造	ガラス交換(普通→強化) 206. 0 m ² 飛散防止フィルム貼 124. 0 m ² コンクリートブロック壁改修 1. 5 m ² 棚固定 26 箇所 ピアノ耐震化 1 箇所
川島町立西中学校 (川島町大字中山 270-1)	6, 090, 000 円	体育館、クラブハウス 建築 : H5. 3 面積 : 2, 616 m ² 構造 : 鉄筋コンクリート造	ガラス交換(普通→強化) 204. 1 m ² 飛散防止フィルム貼 164. 0 m ² CB壁改修 32. 9 m ² 棚固定 16 箇所 エアコン転倒防止 1 箇所 ピアノ耐震化 1 箇所

※ これらの事業(川島中学校内クラブハウス分、西中学校内クラブハウス分を除く)には、「学校施設環境改善交付金」(国の平成 24 年度東日本大震災特別復興会計補正予算分)が充てられている。

※ 交付金事業名 : 防災機能強化(非構造部材耐震化)

工事完成写真（主な工事内容）

○ガラス窓（場所：体育館キャットウォーク）



○ガラス交換等

…… 普通ガラスから強化ガラスに交換、ビートをゴム製から樹脂製に交換



○棚（場所：体育館内の倉庫）



○棚の固定…… 棚の上部を、L字金具により壁に固定



○照明器具（場所：体育館天井）




○照明器具の交換（三保谷小学校、八ツ保小学校）

…… 吊り型照明器具を、直付型照明器具に交換（同時にLED化）



○コンクリートブロック壁（場所：体育館内剣道場）

…… 鉄板とアンカーにより壁を補強（点線で囲った範囲）

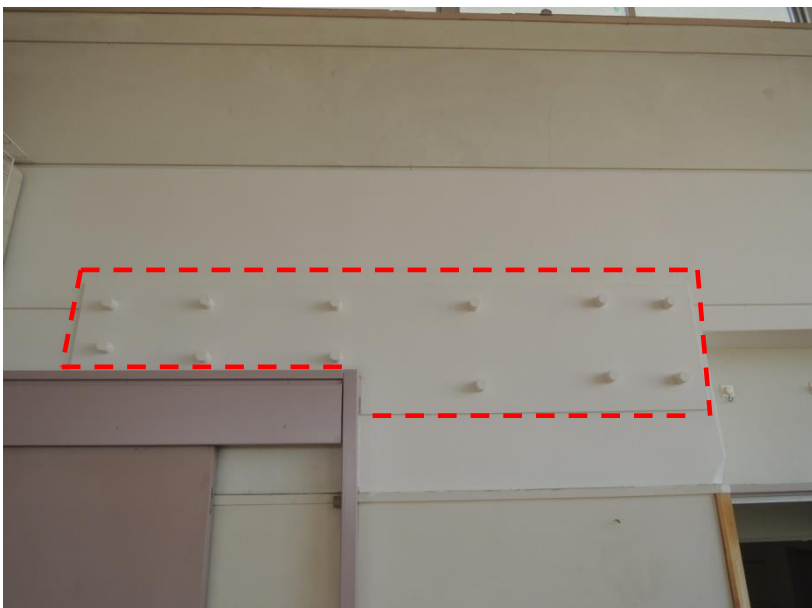

工事完成写真（主な工事内容）

○ピアノ（場所：体育館ステージ）

ピアノの耐震化①……補助脚設置、インシュレーター（皿）交換



ピアノ耐震化②……斜め支持材により脚部補強

